


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A.1	Realizzazione Progetti Revamping STIR	01/07/2016	30/08/2016	60
2	A.2	Gara Revamping STIR	30/08/2016	28/11/2016	90
3	A.3	Procedura Autorizzativa	28/11/2016	27/05/2017	180
4	A.4	Lavori di Revamping	27/05/2017	23/12/2017	210
5	A.5	Collaudo e avviamento Revamping	23/12/2017	22/01/2018	30
6	B.1	Richiesta Schede Informative Comuni	01/07/2016	21/07/2016	20
7	B.2	Sopralluoghi Siti	21/07/2016	10/08/2016	20
8	B.3	Bando per finanziamento Impianti	10/08/2016	09/09/2016	30
9	B.4	Progettazione Impianti Consortili	09/09/2016	08/11/2016	60
10	B.5	Procedura Autorizzativa	08/11/2016	07/05/2017	180
11	B.6	Gara Impianti Consortili	07/05/2017	05/08/2017	90
12	B.7	Lavori Impianti Consortili	05/08/2017	02/05/2018	270
13	B.8	Collaudo e avviamento Impianti Consortili	02/05/2018	01/06/2018	30

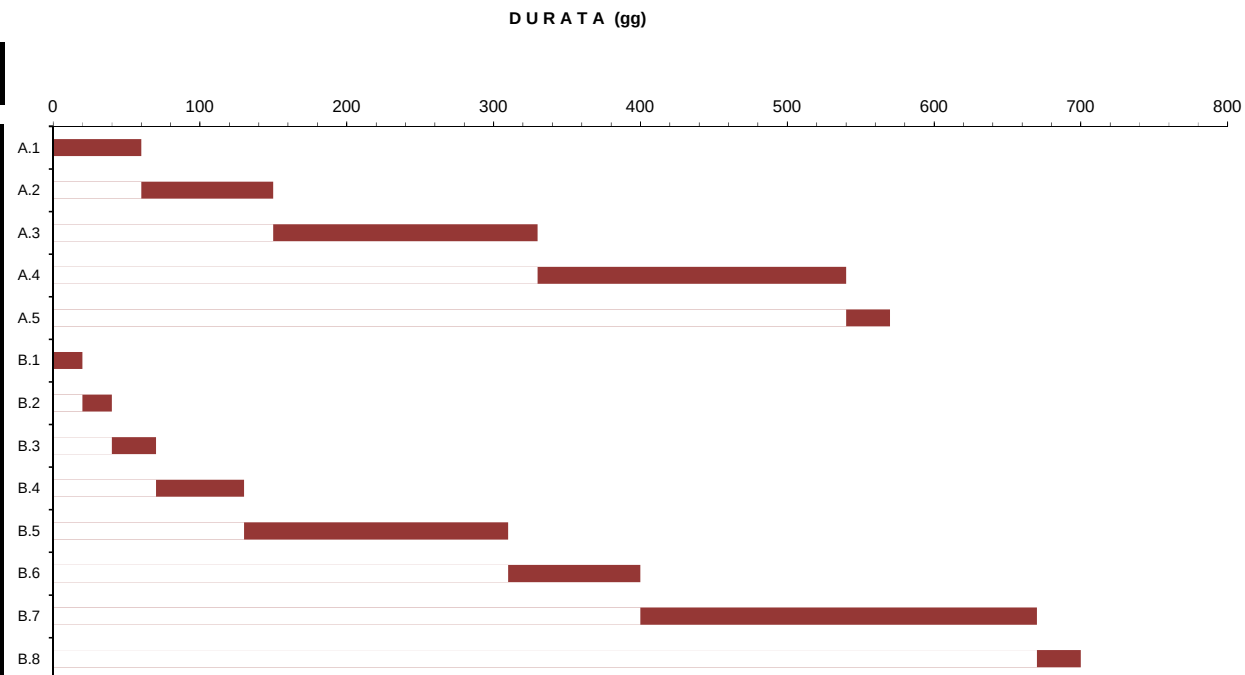

TC

700 gg.
naturali consecutivi

Inizio dei
lavori
0 gg

Fine lavori
700 gg
