# Cronoprogramma Lavori Pubblici

**PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE**
**INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025**

**BENEFICIARIO: COMUNE DI SANT'ANASTASIA CUP: G24D25001070002**
**INTERVENTO:LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SISMISO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL I.C TENENTE MARIO DE ROSA -PLESSO UMEBERTO I**

| | ATTIVITA' ([1]) | Data avvio | | Data conclusione | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | prevista | effettiva | prevista | effettiva |
| 1.A | Approvazione del PFTE *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)* | | | | |
| 2.A | Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori | | | | |
| 1.B | Approvazione del Progetto Esecutivo *(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)* | 01/02/2026 | | 20/05/2026 | |
| 2.B | Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori | 21/05/2026 | | 15/09/2026 | |
| 3 | Aggiudicazione definitiva della gara | 16/09/2026 | | 15/10/2026 | |
| 4 | Stipula del contratto | 16/10/2026 | | 31/11/2026 | |
| 5 | Esecuzione del contratto | 01/12/2026 | | 30/09/2028 | |
| 6 | Regolare esecuzione/Collaudo opere | 01/10/2028 | | 30/11/2028 | |
| 7 | Funzionalità/fruibilità dell'opera | 01/12/2028 | | | |
| 8 | Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) | 01/09/2026 | | 31/12/2028 | |
| 9 | Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva) | | | | |

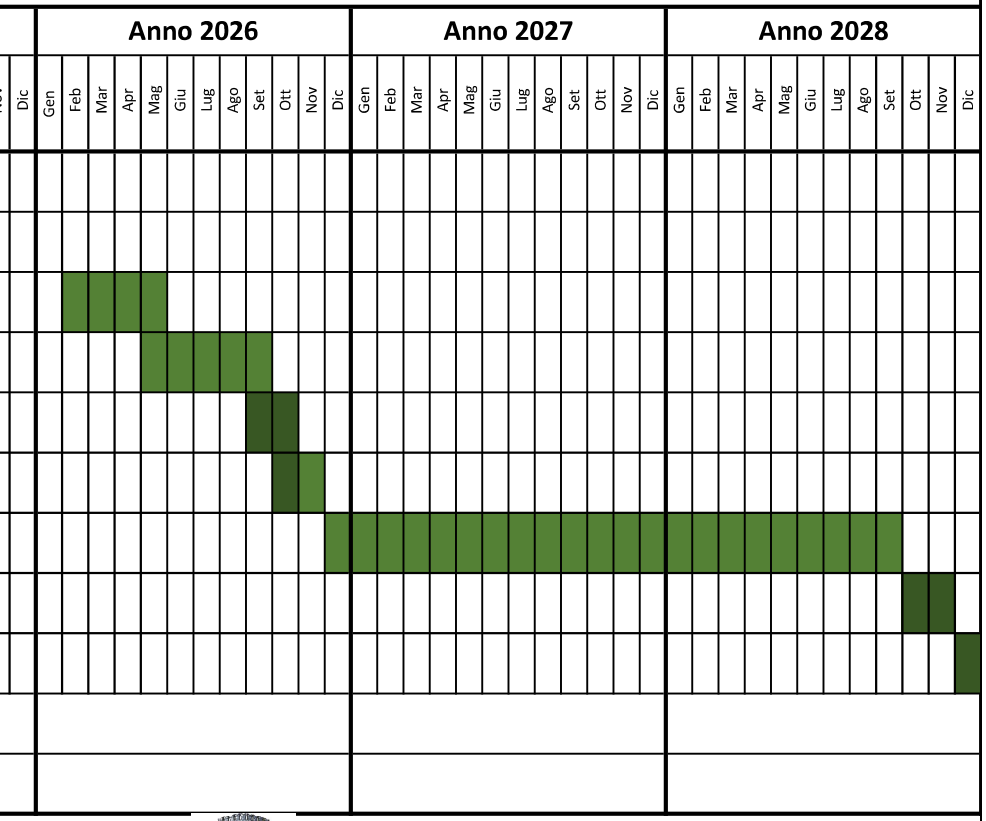


**Informazioni per la compilazione:**
Campi obbligatori SURF
([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

**IL RUP ING. MICHELE PONE**
**firmato digitalmente**

Firmato digitalmente da
**MICHELE PONE**
C = IT

fonte: http://burc.regione.campania.it
