

Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto iniziale repertorio 14560 del 19/04/2019. Ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016

CUP: B29G17000550009

CIG: in corso di acquisizione

Il giorno 27 luglio alle ore 10 in presenza dei componenti dell'ufficio del RUP si è svolta la seduta per l'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di Servizi analoghi.

Premesso che

- la UOD Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione Campania (600601), in attuazione del Decreto della Direzione Generale (D.G) 500700 n. 26 del 30.06.2017, ad oggetto *"Programma di Sviluppo Rurale della CAMPANIA 2014/2020 (FEASR) - Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - con allegati"*, è stata incaricata di adottare la procedura sopra soglia di evidenza pubblica, di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento dell'appalto per il "Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)";
- con Decreto Dirigenziale D.G. 600600 n.169 del 12.09.17, integrato e rettificato dal D.D. n.193 del 13.10.17, sono stati approvati gli atti di gara;
- a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico, con DRD 171/18, divenuto esecutivo giusta nota n. 0104966 del 15.02.2019, l'Ufficio UOD Centrale Acquisti (600601), avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Codice Identificativo di Gara CUP: B29G17000550009 e CIG: 7205166314, ha proceduto alla stipula del Contratto iniziale n. repertorio n. 14560 del 19/04/2019, sottoscritto dalla Regione Campania e la Società Lattanzio KIBS S.p.A. (già Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l.);
- il contratto è attualmente in corso e non si sono rilevate contestazioni con riferimento ad eventuali inadempimenti o irregolarità da parte della società sopra citata;

Considerato che:

- il Regolamento UE 2115/2021 del 2/12/2021 reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per il periodo 2023/2027;

- ai fini della definizione del Piano Strategico della PAC (PSP) per la programmazione 2023-2027, per quanto attiene le politiche dello sviluppo rurale che saranno attuate in Campania, l'Amministrazione Regionale ha necessità di predisporre una dettagliata analisi di contesto, che sia articolata per contesti territoriali (provinciali o sub-provinciali), per singoli comparti produttivi e che sia in grado di guidare la definizione delle strategie, la selezione delle priorità e determinare i risultati attesi dagli investimenti pubblici che saranno attivati, anche in termini di indicatori target;
- ai fini del perfezionamento del PSP presentato dall'Italia, anche a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione Europea in data 31/03/2022, è necessario predisporre un documento di programmazione regionale del PSP 2023-2027 (cosiddetto Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale - CSR) che riporti, oltre all'analisi di contesto sopra definita, anche un'analisi SWOT, la definizione dei fabbisogni regionali, una valutazione ex ante delle priorità di intervento attuabili in Regione Campania e altri elementi che possano essere utili ad un avvio efficace e fluido della programmazione 2023-2027 (anche in relazione a quanto definito dal documento della Rete Rurale Nazionale Linee guida per la redazione dei [Complementi] Regionali per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 del Marzo 2022;
- le attività relative alla predisposizione del documento di programmazione regionale del PSP 2023-2027 (cosiddetto Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale - CSR) oltre a risultare necessarie sono configurabili a pieno titolo come servizi analoghi a quelli prestati in ragione del contratto d'appalto iniziale in essere tra Regione Campania e Lattanzio KIBS SpA repertorio n. 14560 stipulato il 19/04/2019 in ossequio a quanto previsto dall'articolo 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall'articolo 8 del capitolato speciale di appalto e dall'art. 3 del Contratto e che, pertanto, è possibile attivare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara entro un triennio dalla stipula del contratto iniziale.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del comma 5, art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 è possibile aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara se trattasi di servizi consistenti nella ripetizione di Servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che i servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prestazione dei servizi è computato sulla base del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale;

Richiamato l'art 63 comma 5 del D.lgs 50/16 ed ss.mm.ii negli atti di gara e nel contratto come di seguito riportato:

- nel Capitolato d'appalto, approvato con DRD n. 26 del 30/06/2017, all'art.8 - "Corrispettivo dell'appalto", comma 6 è stata formulata espressa riserva in relazione all'affidamento allo stesso contraente, degli stessi servizi e prestazioni oggetto del Capitolato: "*Ai sensi dell'art. 63*

comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 la Regione potrà procedere, in ragione di eventuali integrazioni richieste da Organismi sovranazionali, o discendenti dall'utilizzo di strumenti aggiuntivi per la rilevazione, integrazione e/o rielaborazione dei rapporti richiesti dalla Commissione Europea, all'affidamento di servizi complementari o la ripetizione di servizi analoghi, come la valutazione ex-ante e i servizi di supporto all'analisi di contesto relativa alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale del successivo ciclo di programmazione, all'operatore economico aggiudicatario conformi al progetto di base oggetto del presente capitolato. L'entità stimata di tali servizi in Capitolato è pari al 20% dell'importo a base d'asta a suo tempo fissata a 4.482.227,00 (euro quattromilioniquattrocentottantaduecentoventisette/100) IVA esclusa

- nel Contratto d'appalto iniziale all'art. 3 - Oggetto e consenso del contratto – è previsto che:
"Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016 la Regione potrà procedere, in ragione di eventuali integrazioni richieste da Organismi sovranazionali, o discendenti dall'utilizzo di strumenti aggiuntivi per la rilevazione, integrazione e/o rielaborazione dei rapporti richiesti dalla Commissione Europea, all'affidamento alla Società di servizi complementari o la ripetizione di servizi analoghi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e come previsto dall'articolo 8 del capitolato speciale di appalto, come la valutazione ex-ante e i servizi di supporto all'analisi di contesto relativa alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale del successivo ciclo di programmazione, purché conformi al progetto a base di gara".

Per tutto quanto sopra rappresentato:

- l'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Campania 2014-2022 con nota del 14/04/2022 Prot. PG/2022/0204467(allegato 1), richiamando quanto previsto dall'articolo 8 del capitolato speciale di appalto e dall'art. 3, del Contratto iniziale, ha attivato la procedura per la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'Art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e ha, pertanto, richiesto la disponibilità a Lattanzio KIBS SpA all'esecuzione della ripetizione del servizio, chiedendo di presentare una specifica offerta tecnico-economica tale da garantire la predisposizione di un documento di programmazione regionale del PSP 2023-2027 (cosiddetto Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale - CSR) e riportare, oltre all'analisi di contesto, anche l'analisi SWOT, la definizione dei fabbisogni regionali, la valutazione ex ante delle priorità di intervento attuabili in Regione Campania e altri elementi utili ad un avvio efficace e fluido della programmazione 2023-2027 (anche in relazione a quanto definito dal documento della Rete Rurale Nazionale Linee guida per la redazione dei [Complementi] Regionali per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 del Marzo 2022;
- con pec del 02/05/2022, acquisita al protocollo con il n 231756 del 3/5/2022, l'operatore economico Lattanzio KIKS S.p.A. ha manifestato la volontà di aderire alla proposta di ripetizione del servizio e trasmesso una prima proposta tecnica economica relativa al servizio in oggetto, per un ammontare complessivo pari a euro 896.400,00 (ottocentonovantaseimilaquattrocento/100), al netto di IVA (allegato 2);
- a seguito della trasmissione dell'offerta della Lattanzio KIBS il giorno 19/05/2022 si è svolto un incontro bilaterale, convocato dalla AdG, tra Lattanzio KIBS SpA e AdG /RUP/DEC del Contratto iniziale per analizzare la proposta e negoziare le modalità più idonee di erogazione dei servizi in oggetto. Nel corso di detto incontro (cfr allegato 3) la Società ha illustrato la propria proposta specificando che l'importo complessivo esposto è pari a circa il

20% della base d'asta, in linea con quanto definito nel Capitolato Speciale d'appalto, ed è stato calcolato agli stessi patti e condizioni del contratto principale ovvero sulla base della stima delle giornate occorrenti per realizzare 8 linee di attività di cui si compone il progetto, a loro volta distinte per profilo professionale (Coordinatore (PM), Senior, Junior, CTS), e alle tariffe, offerte in sede di gara per il contratto iniziale, offerte per ciascuno profilo. Le tariffe sono onnicomprensive di costo del personale, di costi per missioni e trasferte, di costi generali e di spese amministrative, di costi per la sicurezza e dell'utile impresa. Le tariffe sono quelle di cui al contratto iniziale in conformità a quanto riportato nella relazione giustificativa prodotta in data 04/05/2019, nel corso della gara, per fornire spiegazioni sui costi proposti nell'offerta essendo questa risultata, ai sensi del comma 1 art. 97 del D.lgs 50/16, anormalmente bassa al fine di verificare la congruità dell'offerta stessa;

- l'AdG, pur concordando con le tariffe applicate, identiche a quelle proposte nel 2019, con l'articolazione e con il contenuto delle 8 linee di attività, ha chiesto di rivedere il cronoprogramma a partite dalle linee di attività (nello specifico linea 1, 2 e 3) riducendo le giornate uomo/profilo stimate e utilmente ridistribuite tra i diversi profili secondo quanto stabilito nel verbale. La Società si è dichiarata disponibile a riformulare l'offerta tecnica presentata in tempi ristretti, data anche la calendarizzazione delle attività, secondo le richieste espresse dalla AdG sia per quanto riguarda i tempi di consegna degli specifici prodotti connessi alle linee di attività, che rispetto alla rimodulazione delle giornate/uomo riformulando al ribasso il costo totale proposto.
- con PEC del 17/06/2022, acquisita al protocollo con il n 331676 del 27/6/2022, Lattanzio KIKS S.p.A. ha trasmesso una versione rivista della proposta tecnica - economica relativa al servizio in oggetto, in virtù della negoziazione del 19/05/2022 (**allegato 4**) e della compressione dei tempi per la predisposizione del PSP, per un ammontare complessivo pari a euro 667.000,00 (seicentossessantasettemila/00), al netto di IVA nella quale sono state rimodulate giornate uomo/profilo stimate e utilmente ridistribuite tra i diversi profili secondo quanto chiesto dall'AdG come da tabelle seguenti:

<i>linea di attività</i>	<i>valore post-negoziazione giugno 2022</i>	<i>valore offerta iniziale maggio</i>	<i>ribasso</i>
1	78.000,00	268.000,00	-70,90%
2	35.500,00	54.000,00	-34,26%
3	37.500,00	73.000,00	-48,63%
4	47.000,00	83.000,00	-43,37%
5	72.000,00	66.000,00	9,09%
6	98.000,00	114.000,00	-14,04%
7	194.000,00	130.400,00	48,77%
8	105.000,00	108.000,00	-2,78%
	667.000,00	896.400,00	-25,59%

linee	giornate			
	coordinatore	senior	junior	CTS
1	-77%	-68%	-54%	-100%
2	-50%	-43%	17%	
3	-50%	-44%	-38%	-100%
4	-50%	-44%	-50%	0%
5	0%	0%	0%	
6	0%	-14%	-33%	0%
7	200%	22%	25%	0%
8	150%	-19%	-17%	
	-9,09%	-27,93%	-27,57%	-50,00%

- con PEC del 04/07/2022 la società Lattanzio Kibs SpA, acquisita al protocollo con il numero 346319 del 05/07/2022, ha riformulato la proposta inviata il 17/06/2022 modificando esclusivamente il Cronoprogramma delle attività previste per la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 del servizio in oggetto mantenendo ferme tutte le altre condizioni compreso la durata complessiva spostando il tempo di completamento delle prime 4 fasi di attività entro il 15 ottobre, anziché il 31 luglio, motivando tale riformulazione del cronoprogramma sulla base: del prevedibile slittamento del cronogramma delle attività per il perfezionamento del PSP e il conseguente posticipo dei tempi per la trasmissione a Bruxelles da parte del MIPAAF della versione rivista del PSP, 2 - per evitare di "mortificare" la fase di interlocuzione con gli uffici regionali responsabili delle singole Misure, oggi (2014-2022), e Interventi domani (2023-2027), al fine di garantire la massima efficacia al servizio svolto, dedicando tutto il tempo necessario alla fase di concertazione con le singole strutture responsabili degli interventi. Si consideri, infine, che ad oggi ancora non sono state perfezionate le procedure di stipula del relativo contratto (allegato 5);
- con nota n. 378137 del 21/07/2022 la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali ha comunicato alla Centrale Unica di committenza della Regione Campania di aver avviato la procedura di negoziata con la Società Lattanzio Kibs S.p.A. (allegato 6);

Valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni normative, tecniche ed economiche necessarie per poter procedere all'affidamento di servizi analoghi da parte del medesimo prestatore, ai sensi del cit. art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (ripetizione di servizi conformi al progetto di base originario, già svolti in virtù di contratto stipulato a seguito di pubblica gara, giusta apposita riserva negli atti di gara e nel contratto inclusi nel valore complessivo del contratto originario, procedura attivabile entro il triennio successivo alla stipula del contratto iniziale);

Valutata, altresì, la documentazione trasmessa in termini di offerta e le dichiarazioni prodotte dalla società Lattanzio Kibs;

Ritenuto, per quanto precede, che l'offerta di cui alla pec del 04/07/2022 (allegato 5) della società Lattanzio Kibs SpA, possa ritenersi congrua e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per l'avvio della programmazione della PAC nel periodo 23/27 anche in relazione alla riformulazione del cronoprogramma per linee di attività e che pertanto possa ritenersi conclusa la fase di negoziazione;

si propone l'affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016, dei servizi consistenti nella ripetizione di Servizi analoghi, alla società Lattanzio Kibs SpA – P. IVA 10115670969 -, già aggiudicataria dell'appalto iniziale, accertato che tali servizi sono conformi al progetto a base di gara e che lo stesso è stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una delle procedure elencate all'articolo 59 ed in particolare, mediante procedura aperta di cui all'art 60 del D.lgs 50/16 ed ss.mm.ii.

I servizi analoghi avranno durata decorrente dalla data di stipula del contratto fino al 30 settembre 2023 e saranno svolti alle stesse condizioni economiche e contrattuali ivi previste.

L'offerta di cui alla pec del 04/07/2022, viene allegata al presente verbale (allegato 5).

Napoli 27 luglio 2022

Ufficio di supporto al RUP

Dott.ssa Dolorinda Renzuto Iodice



Documento firmato da:
DOLORINDA RENZUTO IODICE
27.07.2022 08:22:55 UTC

Dott. Giuseppe Castaldi

Questo documento è di GIUSEPPE CASTALDI
Ruolo: FUNZIONARIO
Organizzazione: REGIONE CAMPANIA
L'insieme di dati digitali (data e ora) presente nella pagina è stato creato ed è stato collegato
hanno validato solo per gli usi della Regione Campania. Replica Test: This digital signature
and the certificate stored in the archive are not valid for documents of the Campania Region
Data: 27/07/2022 18:51:12

Il RUP

Dott.ssa Maria Passari



MARIA PASSARI
Regione Campania
Dirigente
27.07.2022 18:51:12
GMT+01:00



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
50 07 00

Lattanzio KIBS S.p.A.
Via Aurelia, 547
00165 Roma
*c.a. Procuratore speciale
e Responsabile del progetto*
Dott. Virgilio Buscemi

e p.c.

al RUP
Dott.ssa Maria Passari
al DEC
Dott.ssa Daniela Carella

Oggetto: Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019
Richiesta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016.

Premesso che a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto pubblico avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Codice Identificativo di Gara CUP: B29G17000550009 e CIG: 7205166314, ratificata con Contratto n. repertorio n. 14560 del 19/04/2019, stipulato con la Società Lattanzio KIBS S.p.A. (già Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l.), la società sopra citata sta attualmente svolgendo il Servizio di Valutazione Indipendente del PSR Campania 2014-2020.

Premesso che Il Capitolato Speciale d'appalto all'art.8 - "Corrispettivo dell'appalto", stabilisce che l'importo previsto a base di gara è fissato in € 4.482.227,00 (euro quattromilioniquattrocentottantadue miladuecentoventisette/00) IVA esclusa riferito all'intera durata del contratto, ma l'importo globale dell'appalto è fissato in € 5.378.672,00 (euro cinquemilionitrecentosettantottomila-seicentosettantadue/00) IVA esclusa. E sempre allo stesso art. 8 al comma 6 si stabilisce che "Ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 la Regione potrà procedere, in ragione di eventuali integrazioni richieste da Organismi sovraregionali, o discendenti dall'utilizzo di strumenti aggiuntivi per la rilevazione, integrazione e/o rielaborazione dei rapporti richiesti dalla Commissione Europea, all'affidamento di servizi complementari o la ripetizione di servizi analoghi, come la valutazione ex-ante e i servizi di supporto all'analisi di contesto relativa alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale del successivo ciclo di programmazione,

all'operatore economico aggiudicatario conformi al progetto di base oggetto del presente capitolato. L'entità stimata di tali servizi è pari al 20% dell'importo a base d'asta".

Premesso, inoltre, che il Contratto relativo al servizio in oggetto all'art. 3 - Oggetto e consenso del contratto si prevede che: "Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016 la Regione potrà procedere, in ragione di eventuali integrazioni richieste da Organismi sovrapregionali, o discendenti dall'utilizzo di strumenti aggiuntivi per la rilevazione, integrazione e/o rielaborazione dei rapporti richiesti dalla Commissione Europea, all'affidamento alla Società di servizi complementari o la ripetizione di servizi analoghi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e come previsto dall'articolo 8 del capitolato speciale di appalto, come la valutazione ex-ante e i servizi di supporto all'analisi di contesto relativa alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale del successivo ciclo di programmazione, purché conformi al progetto a base di gara".

Considerato che il Regolamento UE 2020/2220, che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022, di fatto protrae di due anni la programmazione 2014-2020 con le risorse della programmazione 2021-2027, utilizzando le regole che governano il periodo di programmazione in corso. In questa direzione, l'approfondita conoscenza dell'attuale contesto regionale dello sviluppo rurale, appare elemento essenziale per utilizzare al meglio il periodo di transizione anche nell'ottica di rendere più rapido, successivamente, il concreto avvio della programmazione 2023-2027.

Considerato, inoltre, che ai fini della definizione del Piano Strategico della PAC (PSP) per la programmazione 2023-2027, per quanto attiene le politiche dello sviluppo rurale che saranno attuate in Campania, l'Amministrazione Regionale ha necessità di predisporre una dettagliata analisi di contesto, che sia articolata per contesti territoriali (provinciali o subprovinciali), per singoli comparti produttivi e che sia in grado di guidare la definizione delle strategie, la selezione delle priorità e determinare i risultati attesi dagli investimenti pubblici che saranno attivati, anche in termini di indicatori target.

Considerato, infine, che, sempre ai fini del perfezionamento del PSP presentato dall'Italia, anche a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione Europea in data 31/03/2022, è necessario predisporre un documento di programmazione regionale del PSP 2023-2027 (cosiddetto Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale - CSR) che riporti, oltre all'analisi di contesto sopra definita, anche un'analisi SWOT, la definizione dei fabbisogni regionali, una valutazione ex ante delle priorità di intervento attuabili in Regione Campania e altri elementi che possano essere utili ad un avvio efficace e fluido della programmazione 2023-2027 (anche in relazione a quanto definito dal documento della Rete Rurale Nazionale *Linee guida per la redazione dei [Complementi] Regionali per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027* del Marzo 2022).

Tutto ciò premesso e considerato, questa Amministrazione Regionale intende avvalersi, ai sensi dell'art. 63 Comma 5 del D.lgs. 50/2016, di quanto disposto dall'art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto e in particolare della ripetizione di servizi analoghi.

Si richiede, pertanto, a codesta società di presentare un'apposita offerta che garantisca lo svolgimento dei servizi sopra elencati nel minor tempo possibile, affinché possano supportare il processo di definizione e avvio della programmazione 2023-2027 e migliorare i contributi che la Regione Campania dovrà inviare al MIPAAF in relazione al perfezionamento del PSP e dei documenti ad esso correlati.

In particolare, le attività richieste sono:

1. **Supporto all'analisi di contesto dello sviluppo rurale regionale per il 2023-2027:**
 - analisi del contesto regionale;
 - analisi di contesto per sistemi locali (p.e. aree degli attuali GAL);



- analisi di contesto per filiere e comparti produttivi (tenendo in considerazione preferibilmente i seguenti: ortoflorofrutticolo, zootecnico, cerealicolo, vitivinicolo, olivicolo-oleario, silvicolo).
- 2. Supporto alla definizione della **SWOT**.
- 3. Supporto alla definizione dei fabbisogni regionali per il 2023-2027 (**Esigenze**).
- 4. Supporto alla definizione delle **priorità e delle scelte strategiche** per lo sviluppo rurale regionale nel 2023-2027 in coerenza con il PSP.
- 5. Supporto alla definizione delle **modalità di attivazione della Progettazione Integrata**.
- 6. Supporto alla definizione dei target relativi ai risultati attesi per il periodo 2023-2027.
- 7. Supporto alla definizione del CSR.
- 8. Valutazione ex ante del CSR.

Si precisa, inoltre, che tale procedura è attivabile perché la presente richiesta ricade all'interno del triennio successivo alla stipulazione del contratto in oggetto.

Si invita, pertanto, codesta società a formulare la propria offerta agli stessi patti e condizioni del contratto di cui all'oggetto. A proporre, in particolare, servizi conformi al progetto posto a base di gara e a tenere in considerazione che le risorse complessive a disposizione, così come previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, ammontano al 20% dell'importo a base d'asta della gara in oggetto e, quindi, precisamente ad un importo massimo pari a euro 896.445,00 (ottocentonovantaseimilaquattrocento-quarantacinque/00), al netto di IVA.

Si precisa che la durata delle attività, dovrà essere di massimo di 18 mesi, per consentire il pieno utilizzo delle analisi ai fini della definizione e dell'avvio della Programmazione 2023-2027.

Le condizioni generali proposte devono essere le medesime di quelle del contratto principale.

Si richiede di ricevere tale offerta entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della presente.

Si resta in attesa di un celere riscontro.

Cordiali saluti.

Napoli, 14 aprile 2022.

L'Autorità di Gestione del PSR

- Dott.ssa Maria Passari -



Documento firmato
da:
MARIA PASSARI
14.04.2022
13:07:00 UTC

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), 2014 - 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019 - Richiesta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 - Trasmissione offerta

Mittente: "Per conto di: lkibs@pec.lattanziogroup.eu" <posta-certificata@pec-email.com>

Data: 02/05/2022, 16:19

A: dg.500700@pec.regione.campania.it

CC: MARIA PASSARI <maria.passari@regione.campania.it>, "daniela.carella@regione.campania.it" <daniela.carella@regione.campania.it>, "buscemi@lattanziokibs.com" <buscemi@lattanziokibs.com>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 02/05/2022 alle ore 16:19:08 (+0200) il messaggio

"Re: POSTA CERTIFICATA: Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), 2014 - 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019 - Richiesta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 - Trasmissione offerta" è stato inviato da "lkibs@pec.lattanziogroup.eu"

indirizzato a:

dg.500700@pec.regione.campania.it

maria.passari@regione.campania.it

daniela.carella@regione.campania.it


buscemi@lattanziokibs.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: qper228.20220502161906.23143.86.1.15@pec-email.com

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,3 kB
postacert.eml	902 kB



Spett.le
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Centro Direzionale Isola A5 - 80141 Napoli

Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014 - 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019

Offerta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016


Gentile Dott.ssa Maria Passari,

in risposta alla richiesta PG/2022/0204467 del 14/04/2022, con la presente si trasmette l'offerta della
LATTANZIO KIBS S.p.A. per la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 del servizio
in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Roma, 02 maggio 2022.

Virgilio Buscemi
Procuratore Speciale
LATTANZIO KIBS S.p.A.



Regione Campania
Data: 03/05/2022 10:25:21, PG/2022/0204467

LATTANZIO KIBS S.p.A.

Sede Legale Via D. Ghisleri, 4 - 20144 Milano (Italia) T. +39 02 20061165
Sede Amministrativa e Operativa Corso della Carbonara, 15 - 70123 Bari (Italia) T. +39 080 5277221
P. IVA 10119079908 - REA 2556743 del 28/11/2017 - Capitale sociale € 1.000.000 i.v.
kibs@pec.lattanziogroup.eu | CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO: R9785694
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di LATTANZIO GROUP S.p.A.

Milano
Roma
Bari
Brescia

www.lattanziokibs.com

Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019. Ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016

*19 maggio 2022 – Uffici della Direzione Generale politiche agricole, alimentari e forestali
Regione Campania*

Sono presenti: per la Regione Campania - Direzione Generale politiche agricole, alimentari e forestali (DGA): Passari (RUP), Carella (DEC), Mazzeo (ass DEC), De Martino (ass DEC), Castaldi (ass RUP), Renzuto (ass RUP); per il Valutatore indipendente (VAL) - LKIBS: Buscemi (coordinatore del servizio), Paris (coordinatore operativo).

L'incontro, convocato con e-mail del RUP dell' 11/05/2022, fa seguito alla trasmissione dell'offerta tecnica presentata dal Valutatore (VAL), ed acquisita agli atti con protocollo n PG/2022/0231756 del 03/05/2022, in riscontro a quanto richiesto dall'AdG del PSR Campania 2014-2022 con nota Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14/04/2022 Prot. PG/2022/0204467.

Il VAL illustra la propria proposta soffermandosi sulle modalità adottate per la quantificazione dell'importo complessivo relativo ai servizi analoghi: in particolare, il costo totale ammonta a circa il 20% della base d'asta, in linea con quanto definito nel Capitolato Speciale d'appalto, ed è stato calcolato agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

I parametri utilizzati per definire il costo complessivo si riferiscono alla stima delle giornate occorrenti per realizzare 8 linee di attività, a loro volta distinte per profilo professionale (Coordinatore (PM), Senior, Junior, CTS), e ai prezzi unitari, offerti in sede di gara, per ciascuno profilo (tariffe).

Il dott. Buscemi ha precisato che le tariffe riportate nella proposta vanno intese onnicomprensive di costo del personale, di costi per missioni e trasferte, di costi generali e di spese amministrative, di costi per la sicurezza e dell'utile impresa. Inoltre, lo stesso ha ribadito che sono stati utilizzati gli stessi prezzi di cui al contratto principale, e più precisamente che tale proposta è espressa in conformità a quanto riportato nella relazione giustificativa prodotta in data 04/05/2019, nel corso della gara, per fornire spiegazioni sui costi proposti nell'offerta essendo questa risultata, ai sensi del comma 1 art. 97 del D.lgs 50/16, anormalmente bassa. Si ricorda che tale relazione fu predisposta in riscontro alla richiesta dell'Amministrazione regionale (pervenuta in data 19/04/2018 - Prot. gen. 0256862) al fine di verificare la congruità dell'offerta stessa.

Infine il dott. Buscemi evidenzia che l'articolazione dei servizi offerti richiama la proposta di indice MiPAAF del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR).

I rappresentanti della DGA, pur concordando con l'articolazione e con il contenuto delle 8 linee di attività, richiedono che il cronoprogramma venga rivisto per tener conto della calendarizzazione che il MiPAAF ha imposto per la redazione del Piano Strategico della PAC (PSP) e, di conseguenza, per la

1

formulazione di alcune scelte regionali che formano oggetto del CSR e che rappresentano il prodotto finale delle attività da porre in essere. La contrazione dei tempi può essere, a parere della DGA, utilmente conseguita considerando che per talune linee di attività (nello specifico linea 1, 2 e 3) sono stati prodotti già dei contributi sia a livello nazionale, da perfezionare sulla base delle specificità regionali, sia a livello regionale con specifici report elaborati dalla stessa DGA nel corso dei lavori preparatori alla bozza di PSP inviata ai Servizi della Commissione il 31/12/2021.

Inoltre va considerato che il VAL, a motivo delle attività del servizio di valutazione di cui è affidatario, ha una conoscenza piuttosto approfondita del contesto economico-sociale e amministrativo in cui si attua l'attuale PSR. Per gli stessi motivi, le giornate uomo/profilo stimate per la realizzazione delle linee di attività sopra menzionate, a giudizio della DGA, possono essere ridotte e utilmente redistribuite tra i diversi profili.

Nello specifico con riferimento all'offerta presentata dalla Lattanzio KIBS, di seguito si riporta la calendarizzazione chiesta dalla DGA per la consegna degli elaborati afferenti alle diverse linee di attività:

- 
- ▶ Per le prime 4 linee di attività si chiede di ricevere un report entro luglio 2022, rimodulando il numero di giornate sulla base del materiale già disponibile (documentazione nazionale e regionale). Si chiede inoltre di avviare tempestivamente le attività previste al punto 4 a partire dagli assunti nazionali rispetto alle priorità identificate da adattare alla Campania con una prima ipotesi relativa alla definizione dei target e alla determinazione degli *Unit amount* (UA) - linea 6. Entro la stessa data si richiede anche un report contenente una prima ricognizione sul punto relativo alla progettazione integrata (linea 5). Tale ricognizione dovrà comprendere delle analisi comparative rispetto ad esperienze maturate in altre regioni. In tal senso va anche fatto riferimento a quanto è in corso di elaborazione sul tema degli smart village che assumono grande rilevanza nella Programmazione 2023-2027.
 - ▶ Entro la fine del 2022 vanno aggiornate, se del caso e in considerazione dell'evoluzione dei lavori a livello nazionale, le prime 4 linee di attività, e definite nel dettaglio con la produzione di specifici report, le linee 5 e 6 relativamente alle scelte della DGA.
 - ▶ Entro il mese di marzo 2023 vanno revisionate, se del caso e sulla base delle indicazioni della DGA e dell'avanzamento dei lavori nazionale, le linee di attività da 1 a 6 con la consegna di una prima release del CSR e della VEXA.
 - ▶ Entro settembre 2023 dovrà essere completata la stesura del CSR con la revisione dei capitoli afferenti alle linee di attività da 1 a 6 e completata la VEXA.

I partecipanti condividono l'opportunità di avviare le attività avendo a riferimento le esigenze manifestate dalla DGA con particolare attenzione sia a quanto prodotto dal MIPAAF in materia di prossima programmazione, le cui linee di intervento, come già precisato, risultano essere fortemente vincolanti, sia alla necessità di rivedere, per i diversi profili professionali individuati, la numerosità delle gg/uomo utili per fornire i prodotti.

Il VAL si dichiara disponibile a riformulare in tempi ristretti, data anche la calendarizzazione delle attività, l'offerta tecnica presentata secondo le richieste espresse dalla DGA sia per quanto riguarda i tempi di consegna degli specifici prodotti connessi alle linee di attività, che alla rimodulazione delle giornate/uomo riformulando al ribasso il costo totale proposto.



La DGA si riserva di riscontrare l'offerta rimodulata dal Valutatore a seguito delle esigenze rappresentate nel corso del presente incontro.

La DGA si riserva, inoltre, la possibilità di valutare la sussistenza delle condizioni per il ricorso ad una procedura di urgenza finalizzata ad avviare almeno le attività di imminente scadenza per le quali i tempi necessari per la formalizzazione del contratto potrebbero mettere a rischio la consegna del relativo prodotto. A questo scopo si impegna ad inviare al VAL uno schema di contratto.


Le parti convengono che la tempistica dei pagamenti sarà dettagliata nell'offerta e traspota nel contratto e sarà agganciata alla consegna dei report relativi alla specifica linea di attività a cui corrisponderà un pagamento commisurato alle gg uomo/profilo/tariffa definite in offerta, mentre il saldo sarà corrisposto solo dopo la verifica di conformità del CSR definitivo e della VEXA.

Del che è verbale che letto e confermato viene sottoscritto alle ore 12,50,


RUP




DEC




Assistenti al RUP



Assistenti al DEC



Lattanzio KIBS



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: POSTA CERTIFICATA: Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), 2014 - 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019 - Richiesta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 - Trasmissione offerta

Mittente: "Per conto di: lkibs@pec.lattanziogroup.eu" <posta-certificata@pec-email.com>

Data: 17/06/2022, 15:28

A: dg.500700@pec.regione.campania.it

CC: MARIA PASSARI <maria.passari@regione.campania.it>, "daniela.carella@regione.campania.it" <daniela.carella@regione.campania.it>, "buscemi@lattanzioikibs.com" <buscemi@lattanzioikibs.com>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/06/2022 alle ore 15:28:31 (+0200) il messaggio

"Re: POSTA CERTIFICATA: Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), 2014 - 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019 - Richiesta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 - Trasmissione offerta" è stato inviato da "lkibs@pec.lattanziogroup.eu"

indirizzato a:

dg.500700@pec.regione.campania.it

maria.passari@regione.campania.it

daniela.carella@regione.campania.it


buscemi@lattanzioikibs.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo del messaggio: opec228.20220617152829.09991.03.1.02@pec-email.com

— Allegati: —

dati-cert.xml	1,3 kB
post-cert.eml	789 kB



Spett.le

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Centro Direzionale Isola A6 - 80141 Napoli

Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Campania a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019

Offerta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 – Versione rivista

Gent.ma dott.ssa Passari,

In risposta alla richiesta PG/2022/0204467 del 14/04/2022, con la presente si trasmette l'offerta della LATTANZIO KIBS S.p.A. per la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 del servizio in oggetto, rivista in virtù di quanto condiviso nell'incontro del 19 maggio u.s. e in base alla compressione dei tempi previsti per la realizzazione delle prime linee di attività.

L'occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Roma, 17 giugno 2022.

Virgilio Buscemi
Procuratore Speciale
LATTANZIO KIBS S.p.A.



LATTANZIO KIBS S.p.A.

Sede Legale Via D. Cimara, 4 - 20144 Milano (Italia) T. +39 02 29061155

Sede Amministrativa e Operativa Corso della Carbonara, 15 - 70125 Bari (Italia) T. +39 080 5277221


P. IVA 10115670800 - REA 2306740 del 28/11/2017 - Capitale sociale € 1.000.000 i.e.

Info@pec.lattanzioagricola.it | CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO: RW9254PS

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di LATTANZIO GROUP S.r.l.

Milano
Roma
Bari
Brescia

www.lattanziokibs.com

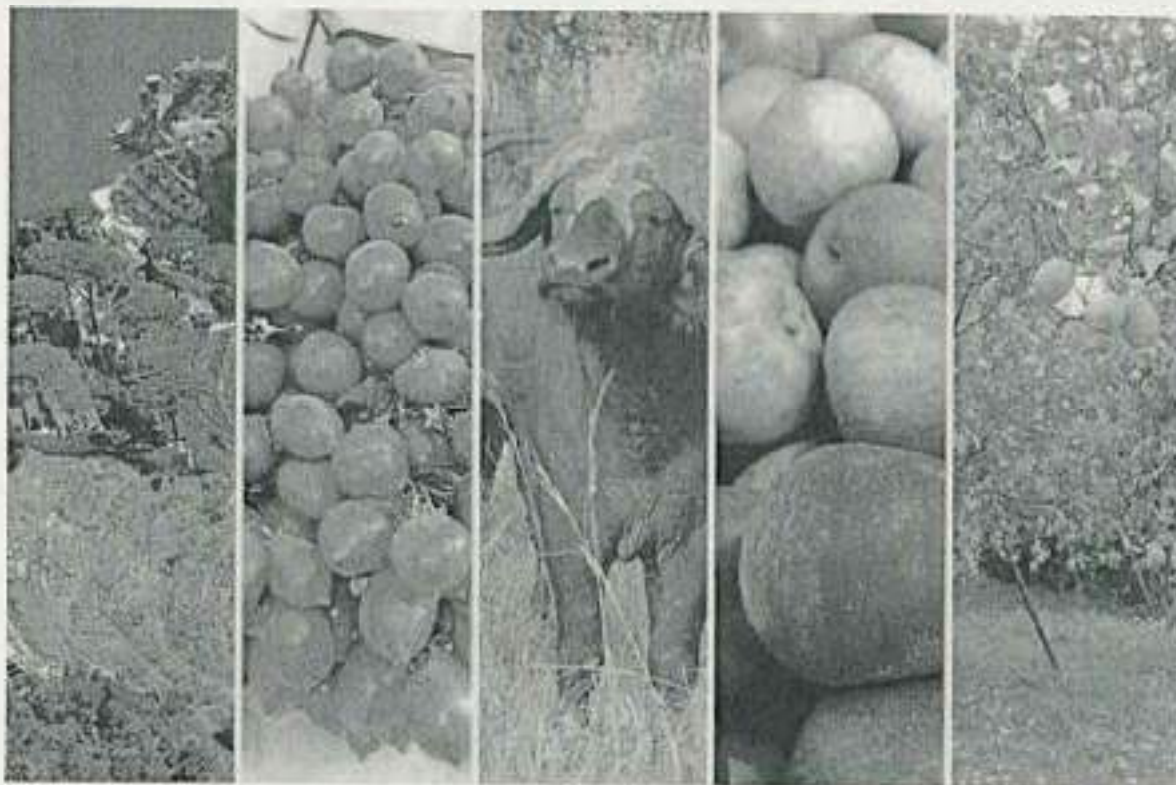

OFFERTA TECNICA

Regione Campania

Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali

**Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014 – 2020 della Regione Campania a valere sul
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
Contratto repertorio 14560 del 19/04/2019**

**Richiesta per ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 comma 5 del
Dlgs 50/2016**

Roma, 17/06/2022

Indice

Lista degli Acronimi	3
Premessa	4
1 Contesto di riferimento della proposta	5
2 I servizi proposti - Le Linee di attività.....	8
2.1 Supporto all'analisi di contesto dello sviluppo rurale regionale per il 2023-2027	9
2.2 Supporto alla definizione della SWOT.....	10
2.3 Supporto alla definizione dei fabbisogni regionali per il 2023-2027 - Esigenze.....	11
2.4 Supporto alla definizione delle priorità e delle scelte strategiche per lo sviluppo rurale regionale nel 2023-2027 in coerenza con il PSP	12
2.5 Supporto alla definizione delle modalità di attivazione della Progettazione Integrata.....	13
2.6 Supporto alla definizione dei target relativi ai risultati attesi per il periodo 2023-2027	14
2.7 Supporto alla definizione del CSR	15
2.8 Valutazione ex ante del CSR.....	17
3 L'organizzazione del servizio.....	18
4 Cronogramma delle attività.....	19
5 Offerta economica per Linee di intervento.....	21

Lista degli Acronimi

ACA	– Agro-Climatico-Ambientali
AdG	– Autorità di Gestione
AdGN	– Autorità di Gestione Nazionale
AT	– Assistenza Tecnica
CdS	– Comitato di Sorveglianza
CE	– Commissione Europea
CSR	– Complementi (Regionali) per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027
CTS	– Comitato Tecnico Scientifico
FEASR	– Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
MIPAAF	– Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
NDM	– New Delivery Model
NGEU	– Next Generation European Union
OG	– Obiettivo Generale della PAC 2023-2027
OS	– Obiettivo Specifico della PAC 2023-2027
PA	– Provincia Autonoma
PAC	– Politica Agricola Comune
PM	– Project Manager
PNRR	– Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PSP	– Piano Strategico nazionale della PAC
PSR	– Programma di Sviluppo Rurale
RRN	– Rete Rurale Nazionale
UE	– Unione Europea
VI	– Valutatore Indipendente

Premessa

Il presente documento, in risposta a quanto richiesto dall'AdG della PSR Campania 2014-2022 con nota Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14/04/2022 Prot. PG/2022/0204467, che, richiamando quanto previsto dalla procedura di gara (Cfr. Capitolato Speciale d'Appalto, Art. 8 - Corrispettivo dell'appalto) e dal conseguente contratto, repertorio n. 14560 del 19/04/2019 (in particolare all'Art. 3 - Oggetto e consenso del contratto), prefigura le circostanze per l'attivazione della procedura per l'estensione dell'incarico di Valutazione indipendente del PSR Campania 2014-2022, ai sensi dell'Art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la ripetizione dei servizi analoghi, fornisce:

- ✓ una **descrizione delle attività** che saranno condotte nel percorso valutativo, in piena coerenza con quanto stabilito dal quadro regolamentare e normativo comunitario e nazionale, e dalle richieste formulate dal MIPAAF in quanto AdG (AdGN) del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027;
- ✓ un accenno all'**organizzazione** del servizio;
- ✓ un **cronogramma** relativo all'articolazione temporale delle attività e alla consegna dei principali prodotti valutativi;
- ✓ il riepilogo delle giornate di figure professionali impegnate nelle suddette attività, con relativo **prezzo unitario e prezzo totale** (in conformità alle condizioni previste nel contratto principale).

1 Contesto di riferimento della proposta

La programmazione 2023-2027 rappresenta una sorta di "rivoluzione copernicana" per la Politica Agricola Comunitaria - PAC. Nel corso delle diverse programmazioni è la prima volta che la Commissione riconduce tutti gli strumenti finanziari a disposizione dell'agricoltura europea all'interno di un unico quadro di riferimento programmatico.

In passato I e II Pilastro si sono sempre mossi su binari paralleli, "dialogando" in maniera sporadica dal punto di vista programmatico e attuativo, se non per gli aspetti riguardanti la condizionalità. L'elemento di discontinuità più marcato rispetto al passato va collocato dunque nella dimensione dialogica della *governance* sia nella fase della programmazione, che in quella dell'attuazione della futura PAC. Riportare la strategia di intervento della PAC all'interno di un documento unico e coerente impone, infatti, un'interazione interistituzionale senza precedenti all'interno del mondo dell'agricoltura, della silvicoltura e dello sviluppo rurale.

Nel corso del processo di costruzione del nuovo PSP, sono intervenuti due elementi che hanno creato problematiche di ordine diverso, determinando, il protrarsi della fase di concertazione:

- ✓ l'insorgere a livello planetario della pandemia Covid-19;
- ✓ la perdurante aleatorietà del quadro politico, finanziario e di quello normativo.

Il combinato disposto di questi due aspetti ha fatto sì che la nuova programmazione venisse traslata di due anni, dal 2021 al 2023 - con il periodo 2021-22 che è diventato un'estensione della programmazione 2014-2020 finanziata con risorse nuove (FEASR e NGEU) - e che la costruzione del nuovo Piano abbia subito uno stop prolungato, per poi accelerare nell'ultimo semestre del 2021, imponendo una calendarizzazione piuttosto impegnativa dei lavori.

Le amministrazioni coinvolte (UE, MIPAAF, Regioni e Province Autonome) hanno dovuto fronteggiare il profondo shock generato dalla pandemia sul contesto, cimentandosi con nuovi riferimenti normativi, rinnovati strumenti di intervento e, a cascata, riprogrammazioni e rimodulazioni, per poter intervenire tempestivamente in soccorso di aziende, settori e territori in sofferenza e per poter costruire le basi per il periodo di estensione del 2021-2022, in armonia con gli altri strumenti che sia andavano definendo a livello nazionale, in primis il PNRR.

Tale processo ha previsto un intenso lavoro a livello strategico e tecnico che di fatto, a parità di risorse umane, ha rallentato il processo di costruzione del nuovo Piano strategico della PAC. Il PSP formulato a livello centrale deve infatti prevedere una logica di intervento globale basata sull'applicazione rigorosa del ciclo di pianificazione che parte, come noto, dalla definizione dei fabbisogni basati sulle evidenze.

Lo shock pandemico non si è manifestato solo sul contesto, ma si è riverberato sulle strutture organizzative centrali e regionali titolari della gestione dei fondi.

Concretamente, ad oggi, tale processo può essere suddiviso in cinque fasi:

1. Fine del 2019: il MIPAAF ha concluso l'analisi di contesto con il completamento dei "Policy brief", l'identificazione delle matrici SWOT e dei fabbisogni per Obiettivo Specifico della PAC.
2. Nel 2021: il Ministero ha provveduto a concludere il processo di gerarchizzazione delle esigenze/fabbisogni su scala nazionale (settembre 2021), coinvolgendo le AdG regionali e il partenariato del PSP.
3. A partire da ottobre 2021: il Ministero ha avviato una serie di tavoli con i rappresentanti delle Regioni e PP.AA. per la redazione delle schede di intervento per lo sviluppo rurale e la definizione degli ecoschemi.
4. Il 31/12/2021: è stato inviato alla CE un PSP "ricevibile" ovvero completo formalmente in tutte le sue parti.
5. Il 31/03/2022: sono pervenute le osservazioni dal PSP da parte della Commissione Europea (CE) – DG AGRI ed è stato avviato il processo di revisione e integrazione del PSP.

Da questo breve elenco, appare evidente che dalla fase 1 "identificazione dei fabbisogni" alla fase 2 "avvio del processo di gerarchizzazione" è intercorso più di un anno e ciò a riprova delle conseguenze profonde determinate dagli elementi esogeni di shock sopra evidenziati. Per quanto riguarda poi la versione di dicembre 2021 del PSP, essa rappresenta un primo sforzo verso l'inquadramento complessivo degli interventi attuabili in Italia.

Le molte osservazioni che sono giunte dai servizi della CE il 31 marzo 2022 richiedono di entrare nel merito della complessità strategico-tecnico-amministrativa prevista per la definizione delle linee di intervento contenute nel Piano.

L'analisi dei passaggi temporali che si sono susseguiti consente di riflettere su quanto abbia influito l'aleatorietà del quadro programmatico sull'avanzamento del PSP: nel momento in cui si sta scrivendo la presente offerta, i regolamenti sulla nuova PAC sono stati di recente approvati, mentre gli atti delegati sono in corso di approvazione.

Le amministrazioni regionali sono attualmente impegnate nell'elaborazione di un documento di programmazione regionale, che possa declinare puntualmente le scelte illustrate nel PSP e rispondere così alle richieste di integrazioni e chiarimenti espresse dalla CE a fine marzo. Si tratta di un Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027, la cui struttura è stata definita nel mese di marzo in un documento redatto dalla Rete Rurale Nazionale¹ e messo a disposizione di tutte le amministrazioni regionali, per standardizzare il processo di elaborazione di tali documenti programmatici.

¹ Cfr. *Linee guida per la redazione dei [Complementi] Regionali per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027* – Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20 Piano di azione biennale 2021-2022 Scheda progetto CREA I.I. - Marzo 2022.

In questa fase particolarmente delicata, appare essenziale per la Regione Campania poter usufruire di un supporto specialistico mirato, come quello che potrà fornire il Valutatore Indipendente (VI) dell'attuale PSR, per elaborare analisi e formulare proposte operative per delineare al meglio la strategia programmatica degli interventi della PAC a livello regionale nel periodo 2023-2027, anche in relazione all'integrazione con altre risorse finanziarie, che insistono sul territorio regionale, come quelle dei programmi co-finanziati dai Fondi Strutturali o dal PNRR.

Di seguito si illustrano gli ambiti che potranno essere oggetto di tale supporto specialistico.

2 Servizi proposti e Linee di attività

I servizi di valutazione e consulenza proposti sono finalizzati a supportare la Regione Campania nel processo di declinazione programmatica e di attuazione a livello regionale del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027. Ciò con l'obiettivo generale di assicurare requisiti di coerenza, efficacia e pertinenza/rilevanza agli interventi del PSP in Campania, alla luce delle sue specificità territoriali, ambientali e settoriali e delle priorità strategiche regionali per la PAC.

La tipologia e l'organizzazione dei servizi offerti tengono conto degli orientamenti, non vincolanti, forniti nelle Linee guida predisposte da RRN-MIPAAF (marzo 2022), del quadro normativo comunitario di riferimento per la PAC 2023-27 (in particolare con il Reg. (UE) 2021/2115) e si adegueranno nel corso delle attività in funzione delle esigenze di analisi e delle richieste di supporto tecnico espresse dall'Autorità di Gestione Nazionale (AdGN) e dall'AdG regionale, nel corso del processo di elaborazione, presentazione, eventuale revisione e approvazione del PSP e del CSR.

Di seguito, per ciascuna Linea di attività prevista, si riporta una scheda sintetica che illustra gli obiettivi del servizio, le modalità e i criteri di svolgimento della Linea e i prodotti che si prevede di elaborare. Tale pianificazione potrà naturalmente essere revisionata e adattata per orientarla in virtù del mutare delle esigenze dell'Amministrazione regionale e anche per coordinarla con le altre attività di supporto e con le diverse di AT che operano in favore dell'AdG del PSR.

2.1 Supporto all'analisi di contesto dello sviluppo rurale regionale per il 2023-2027

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Analizzare le dinamiche temporali e gli aspetti caratterizzanti dei "contesti" regionali di tipo territoriale, ambientale, sociale e settoriale nei quali interviene la PAC 2023-27, funzionali alla individuazione delle esigenze prioritarie di intervento.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Il servizio elaborerà l'analisi di contesto delle tematiche e questioni connesse a ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 2021/2115, inclusive dei fabbisogni informativi e di analisi espressi dall'AdG. A supporto di tali analisi è previsto il popolamento degli Indicatori comuni di contesto di cui all'articolo 115, paragrafo 2 ed elencati nell'allegato I del Regolamento, secondo procedure e definizioni coerenti con i documenti tecnici di indirizzo predisposti dai Servizi della Commissione e dalla RRN. L'analisi potrà basarsi anche su "altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate quali studi, relazioni di valutazione passate e insegnamenti tratti da precedenti esperienze" (Cfr. Reg. (UE) 2021/2115 art.115 (2)). Come è noto, la PAC 2023-2027 si articola in 3 Obiettivi Generali (OG) e 9 Obiettivi Specifici (OS). Nell'ambito dell'OS 3 l'analisi si articolerà per le principali filiere produttive agricole regionali (ortofrutticola, filiere zootecniche, cerealicola, vitivinicola, olivicolo-olearia, silvicolo). Nell'ambito dell'OS.8 l'analisi terrà conto anche delle attuali aree Leader.
<i>Prodotti attesi</i>	Un elaborato con analisi di contesto per OS (incluso quello trasversale riferito all'AKIS), eventualmente comprensivo dei relativi indicatori comuni e specifici.

2.2 Supporto alla definizione della SWOT

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Per ciascun obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 2021/2115, saranno descritti in sintesi i "punti di forza" (S), i "punti di debolezza" (W), le "opportunità" (O) e le "minacce" (T) individuati nel territorio regionale della Campania.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	L'analisi SWOT del CSR Campania, sulla base dei risultati della fase di analisi di cui al precedente punto 1, integrerà e verificherà gli elementi già individuati nell'analisi SWOT condivisa nell'ambito del "percorso nazionale" della PAC e inclusa nel PSP nazionale (notificato in prima versione nel dicembre 2021 e nei successivi eventuali aggiornamenti). Con essa saranno evidenziate le peculiarità regionali che necessiteranno di una descrizione specifica per giustificare le priorità di intervento. In questa fase potrà esser previsto il diretto coinvolgimento di esperti regionali (Responsabili e tecnici della Amministrazione regionale a livello centrale e territoriale, di altri Enti o istituti) nella individuazione/descrizione degli elementi della SWOT, attraverso il ricorso a tecniche di confronto di gruppo e percorsi partecipati.
<i>Prodotti attesi</i>	Dei Quadri sinottici con la rappresentazione degli elementi della SWOT definiti a livello regionale, a conferma e/o integrazione degli elementi della SWOT del livello nazionale.

2.3 Supporto alla definizione dei fabbisogni regionali per il 2023-2027 - Esigenze

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Per ciascun obiettivo di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del Regolamento UE 2021/2115, saranno descritte le esigenze di intervento nei settori agricolo e forestale che orientano la definizione e attuazione degli interventi del PSP (cioè la sua logica di intervento) in ambito regionale. Come richiesto all'art.108 del Regolamento, inoltre, per gli OS.4, 5 e 6 la valutazione delle esigenze terrà conto dei piani nazionali o regionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli atti legislativi elencati nell'allegato XIII dello stesso Regolamento.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Con riferimento alle 49 esigenze definite a livello nazionale nel Piano Strategico della PAC, sulla base delle analisi condotte nelle precedenti fasi di lavoro e anche in base agli esiti di eventuali momenti di confronto e scambio con gli esperti regionali, saranno sviluppati i seguenti profili di analisi: • Individuazione delle esigenze di intervento di rilevanza regionale. • Eventuale approfondimento di analisi di alcune esigenze al fine di meglio cogliere le loro specificità in ambito regionale. • Integrazione (o declinazione) delle 49 esigenze del livello nazionale al fine di mettere in luce questioni specifiche settoriali o territoriali di interesse regionale. Tali attività potranno essere sviluppate, per ciascun Obiettivo Specifico, insieme all'Analisi SWOT (di cui al precedente paragrafo 2.3) nell'ambito di una comune applicazione di metodi e strumenti basati anche sulla diretta partecipazione di eventuali esperti regionali.
<i>Prodotti attesi</i>	Quadri sinottici con la rappresentazione per Obiettivo Generale (OG) e Specifico (OS) della PAC delle esigenze individuate/riformulate/aggiunte in base alle specificità regionali.

2.4 Supporto alla definizione delle priorità e delle scelte strategiche per lo sviluppo rurale regionale nel 2023-2027 in coerenza con il PSP

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Per ciascun Obiettivo Specifico (OS) di cui all'articolo 6 del Regolamento UE 2021/2115 saranno definite le priorità e la relativa strategia di intervento a livello regionale, in raccordo con gli obiettivi strategici regionali per il periodo 2023-2027.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Questa Linea di attività si collega direttamente agli esiti della precedente, realizzando la prioritizzazione delle esigenze individuate/riformulate/aggiunte a livello regionale. Si potrà fare riferimento, previa condivisione di tale approccio con l'AdG, alla metodologia adottata dalla RRN per il livello nazionale, basata su percorsi partecipativi e che conduce a quattro categorie di priorità: strategica, qualificante, complementare, marginale. Le attività potranno essere completate con il supporto mirato all'AdG nella prima definizione degli Interventi da attuare in ambito regionale, in risposta e in coerenza con le esigenze prioritarie individuate.
<i>Prodotti attesi</i>	Integrazione dei Quadri sinottici elaborati nella Linea di attività descritta al paragrafo precedente (2.3), con l'assegnazione a ciascun esigenza di specifico livello o categorie di priorità. Prima individuazione degli Interventi che potranno essere attuati a livello regionale ed esplicitazione del loro legame con le esigenze individuate.

2.5 Supporto alla definizione delle modalità di attivazione della Progettazione Integrata

<i>Obiettivi del servizio offerto</i>	Saranno individuati e definiti le potenziali azioni di supporto volte a favorire la progettazione integrata a livello aziendale, territoriale, settoriali, oltre alle azioni più efficaci per promuovere l'Intervento "cooperazione".
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Si supporterà in forma diretta l'AdG per la individuazione e la definizione delle forme più efficaci di progettazione integrata. L'attività sarà svolta anche sulla base degli esiti della valutazione delle esperienze di tali forme di progettazione svolte in ambito regionale nella programmazione 2014-2022.
<i>Prodotti attesi</i>	Ipotesi di progettazione integrata da sviluppare a livello regionale, quali "pacchetti attuativi" o altre forme di integrazione tra interventi, in ambito aziendale o (tra più soggetti) di filiere o di territori rurali.

2.6 Supporto alla definizione dei target relativi ai risultati attesi per il periodo 2023-2027

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Supportare il processo di determinazione dei target finali e intermedi per ciascun Obiettivo Specifico (OS) della PAC.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Supporto tecnico all'AdG e alle strutture di coordinamento nello svolgimento delle stime previsionali a livello regionale sulla base della pianificazione finanziaria per intervento, degli output attesi e delle esperienze/valutazioni svolte in precedenti periodi di programmazione, anche in considerazione del NDM. Tale attività sarà svolta in stretto collegamento con MIPAAF e RRN.
<i>Prodotti attesi</i>	Per ciascun Obiettivo Specifico si elaborerà una formulazione e una descrizione di ipotesi di target finali e intermedi per gli indicatori di risultato, a livello regionale.

2.7 Supporto alla definizione del CSR

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Contribuire alla elaborazione del CSR per la Campania in coerenza con gli indirizzi metodologici concordati a livello nazionale dalle AdG.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Il servizio si esplicherà in attività di supporto per il coordinamento tecnico, l'acquisizione di informazioni e documentazione, il supporto all'elaborazione di testi e di dati, nell'insieme finalizzate alla redazione del CSR Campania, secondo la tempistica definita a livello nazionale con il MIPAAF e il Coordinamento delle AdG regionali. L'attività sarà svolta sulla base degli orientamenti forniti dalla AdG e in stretta collaborazione con le diverse strutture regionali interessate agli interventi PAC 2023-2027.
<i>Prodotti attesi</i>	Documento di sintesi riportante i contributi forniti per l'elaborazione del CSR della Campania.

Inoltre, nell'ambito di tale Linea di attività, potranno anche essere erogati ulteriori servizi descritti nelle seguenti schede riportate alla pagina successiva.

Si fa presente che, le concrete modalità operative dell'eventuale erogazione di tali attività, andranno concordate con l'Amministrazione nella fase di avvio del servizio.

Supporto alla definizione degli interventi

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Adeguare e qualificare gli elementi comuni presenti nelle schede di intervento già definite nel PSP in relazione alle specificità regionali.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Il servizio sarà rivolto all'AdG e alle sue strutture di coordinamento e ai Responsabili regionali per area/linea di intervento per attività di: • Supporto all'individuazione degli interventi che si intendono attivare, con proiezione nell'arco della programmazione (periodo 2023-2029) dei prodotti che intende realizzare. • Supporto alla definizione degli interventi ammissibili, in ogni caso coerenti con le tipologie scritte nel PSP. Ad esempio, tipologie di macchinari, specificazione impegni ACA, etc. • Supporto alla definizione dei criteri di ammissibilità (specifiche tecniche, elementi descrittivi) e obblighi aggiuntivi (non remunerati) che non influenzano il raggiungimento degli obiettivi che caratterizzano l'intervento a livello regionale (ad es. certificazione antimafia). • Supporto alla definizione dei principi di selezione degli interventi: Priorità settoriali, territoriali o altro; zonizzazione degli interventi.
<i>Prodotti attesi</i>	Formulazione di indicazioni sugli elementi comuni delle schede di intervento.

Supporto alla pianificazione finanziaria e alla definizione degli output

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Supporto alla definizione del piano finanziario e degli obiettivi di realizzazione (output) per Intervento da attuare nella regione Campania.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	Supporto tecnico all'AdG e alle strutture di coordinamento nello svolgimento delle stime previsionali a livello regionale relative al fabbisogno finanziario/capacità di spesa dei diversi Interventi e gli output da essi attesi. A tale scopo si terrà conto dei target nazionali e delle esperienze/valutazioni realizzate in ambito regionale nei precedenti periodi di programmazione. Tale attività sarà svolta in stretto collegamento con MIPAAF e RRN.
<i>Prodotti attesi</i>	Per ciascun Intervento si supporterà l'elaborazione di ipotesi di piano finanziario e obiettivi di output.

2.8 Valutazione ex ante del CSR

<i>Obiettivo/i del servizio offerto</i>	Supportare il processo di programmazione regionale, attraverso un documento che possa accompagnare il percorso programmatico e fornire indicazioni sulla qualità della scelte programmatica poste in essere.
<i>Modalità/criteri di svolgimento del servizio</i>	L'attività si concretizzerà in momenti di confronto sulle scelte operate, per definire la coerenza con i fabbisogni e le esigenze definite e per verificare la congruità dei target stabiliti per ciascun intervento programmato.
<i>Prodotti attesi</i>	Valutazione ex ante del CSR.

3 Organizzazione del servizio


Per lo svolgimento del servizio e per la realizzazione delle singole Linee di attività, descritte alle pagine precedenti, saranno utilizzate le risorse professionali componenti il Gruppo di Lavoro del contratto principale, ampiamente adeguate allo svolgimento di tutte le attività programmate.

Tuttavia, si valuterà, di concerto con l'Amministrazione, se coinvolgere ulteriori professionalità per garantire una migliore gestione dei picchi di lavoro e il massimo presidio territoriale delle singole attività previste.

4 Cronogramma delle attività

Alla pagina seguente è riportato un sintetico cronogramma delle attività. Esso si basa sull'ipotesi di un avvio delle attività oggetto della presente ripetizione dei servizi nel mese di giugno 2022.

Si fa presente che tali tempistiche potranno, tuttavia, essere riviste all'avvio delle attività e in corso d'opera, sulla base delle esigenze che si manifesteranno e che caratterizzeranno il dinamico contesto di riferimento.

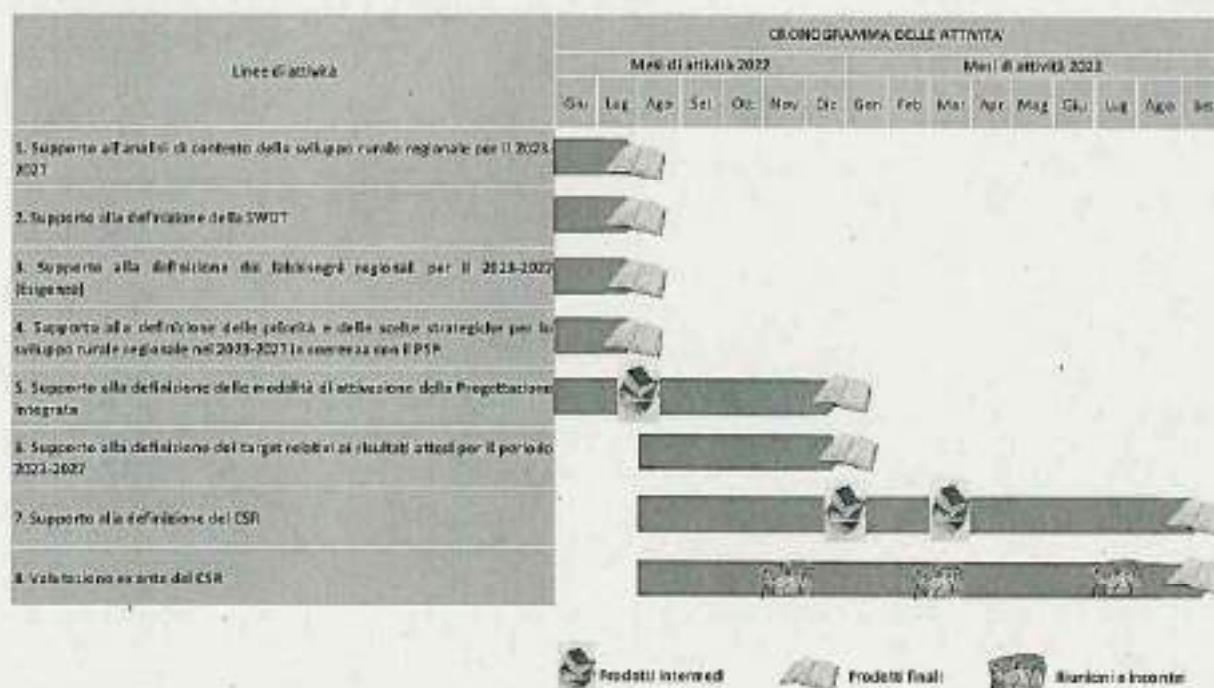

LATTANZIO
KIBS

5 Offerta economica per Linee di intervento

La tabella seguente riporta la pianificazione delle giornate uomo necessarie per lo svolgimento di ciascuna Linea di servizio, distinte per profilo professionale (Coordinatore (PM), Senior, Junior, CTS), agli stessi patti e condizioni (**prezzo offerto per figura professionale: tariffe**) del contratto principale, in conformità a quanto riportato nella documentazione prodotta dal Proponente per giustificare l'anomalia dell'offerta in sede di gara, inoltrata all'Amministrazione regionale in data 04/05/2019, in risposta alla specifica richiesta pervenuta in data 19/04/2018 (Prot. gen. 0256862), e formalmente approvata con l'accettazione delle giustificazioni fornite, in cui sono riportate le tariffe per ciascun profilo professionale e il prezzo del personale impiegato nell'attività.

Dalla tabella riportata alla pagine seguente si evince pertanto il prezzo offerto per ciascuna Linea di servizio e il prezzo totale offerto per tutte le attività previste.

Linee di attività	GG uomo Coordinatore	GG uomo Senior	GG uomo Junior	GG uomo CTS	Prezzo
1. Supporto all'analisi di contesto dello sviluppo rurale regionale per il 2023-2027	15	90	60		78.000,00
1.1. Analisi del contesto regionale	5	35	20		25.000,00
1.2. Analisi di contesto per alcuni temi	5	40	30		31.000,00
1.3. Analisi di contesto per filiere e comparti produttivi	5	15	20		25.000,00
2. Supporto alla definizione della SWOT	5	40	35		35.500,00
3. Supporto alla definizione dei fabbisogni regionali per il 2023-2027 (singolari)	5	50	25		37.500,00
4. Supporto alla definizione delle priorità e delle scelte strategiche per lo sviluppo rurale regionale nel 2023-2027 in coerenza con il PSR	10	50	20	10	47.000,00
5. Supporto alla definizione delle modalità di attuazione della Programmazione Integrata	10	100	20	10	72.000,00
6. Supporto alla definizione dei target relativi ai risultati attesi per il periodo 2023-2027	10	120	40	10	96.000,00
7. Supporto alla definizione del CSR	60	220	60	10	194.000,00
8. Valutazione ex ante del CSR	25	130	50		135.000,00
Totale	150	800	314	40	657.000,00
Prezzi unitari GG uomo (Euro) IVA esclusa (scad. post. e onestazioni)	1.000,00	300,00	200,00	900,00	
Prezzo totale euro IVA esclusa					657.000,00

LATTANZIO
KIBS
